

# 목 차

I. 일반현황	1
---------	---

## II. 2021년 주요업무계획

○2030년 울진 군관리계획(재정비) 용역	4
○연호근린공원 조성	6
○죽변~후정간 해안 경관도로 개설사업	8
○월변지구 도시개발 추진	10
○북면도시계획도로(8개대안사업)	13
○후포도시계획도로(소로2-20호선) 배수로 정비	19
○후포도시계획도로(중로1-1호선) 회전교차로 설치	21
○죽변도시계획도로(소로3-16호선) 덧씌우기공사	23
○평해도시계획도로(중로1-1호선) 덧씌우기공사	25
○죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진	27
○2021년 도시재생예비사업(후포면) 추진	30
○나곡4리 농어촌 취락지역 생활여건 개조사업	32
○온정지구 맑은물 푸른농촌 가꾸기사업	33
○환한 골목 프로젝트(읍면 보안등 확대설치) 추진	36
○가로등·보안등 광원 변경 지속 추진	37
○가로등 신속 유지보수체계 운영 및 설치사업	38
○Big3 축제 통합 표준 디자인·캐릭터 개발	39
○포토조형물 설치(관광지에 작품하나)	41
○벚꽃 길 경관조명 설치	42

소통행정·현장근정·비즈니스

## 도시새마을과

○일반농산어촌개발사업 추진(종합진도 49.5%) .....	44
○기성면 농촌중심지 활성화사업 .....	48
○북면 농촌중심지 활성화사업 .....	51
○금강송면 농촌중심지 활성화사업 .....	53
○평해읍 기초생활거점 육성사업 .....	56
○울진군 신활력플러스 사업 .....	58
○어울진 시군창의사업 추진 .....	60
○십이령 바지개꾼마을 농촌다움복원사업 .....	62
○마을회관 개선사업 .....	65

## II. 특수시책

○후포면 도시재생 뉴딜사업 공모 추진 .....	66
○농촌협약 사업 추진에 따른 용역 시행 .....	67
○취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진 .....	68

## I. 일반현황

### □ 직원 정·현원

[단위:명]

실 과 명	정 원	현 원
도시새마을과	23	23

### □ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	담 당 업 무
계	23	
과 장	1	• 도시새마을과 업무총괄
도시계획	5	• 군관리계획 • 개발행위허가 • 자연공원 및 도시공원 관리
도시개발	4	• 도시토목사업 • 자전거인프라구축 • 도시토목사업 토지수용 및 용지매수 보상
새 마을	5	• 마을회관 신축 및 보수, 소도읍육성사업 • 농촌생활환경정비사업, 읍면소재지종합정비사업 • 새마을 조직 관리 및 사업 추진
공공디자인	4	• 경관디자인 업무 • 옥외광고물 관리 • 가로등 설치 및 보수
도시재생	4	• 농촌협약사업 총괄·기획 • 도시재생사업 총괄·기획 • 중간지원조직 관리 운영 • RAISE시스템 관리 등 사후관리 • 온천이용관리

## □ 각종 통계현황

### ○ 용도지역 구분

[단위:km<sup>2</sup>]

구분		면 적 (㎡)	구성비 (%)	비고
합계		989,209,919	100.00	
도시지역		47,920,405	4.84	
관 리 지 역	소계	163,537,523	16.53	
	보전관리지역	80,597,174	8.15	
	생산관리지역	9,511,596	0.96	
	계획관리지역	73,428,753	7.42	
농림지역		744,301,872	75.25	
자연환경보전지역		33,450,119	3.38	

### ○ 군립공원 및 온천

구 분	명 칭	위 치	면적(km <sup>2</sup> )	지정일자
군립공원	계	2개소	31.87	
	불영계곡 군립공원	근남면 수곡 · 행곡리 울진읍 대흥리, 금강송면 삼근 · 하원리	25.595	1983. 10. 5
	덕구온천 군립공원	북면 덕구리 일원	6.275	1983. 10. 5
온천	계	4개소	1.707	
	덕구온천	북면 덕구리 일원	0.54	1983. 12. 26.
	백암온천	온정면 온정리 · 소태리 일원	0.176	1981. 10. 12.
	죽변해심원 온천	죽변면 죽변리 일원	0.0045	2013. 12. 19.
	성류온천	근남면 수곡리 일원(개발계획 수립)	0.991	1996. 5. 23.

### ○ 전문건설업 및 옥외광고업

[단위:개소]

계	구분	전문건설업	옥외광고업	비 고
313		375	27	

### ○ 가로등 현황

[단위:개소]

읍면별	계	종 류 별		비 고
		가 로 등	보 안 등	
합 계	12,353	4,358	7,995	
울진읍	2,226	902	1,324	
평해읍	1,115	429	686	
북 면	1,303	310	993	
금강송면	827	292	535	
근남면	1,193	507	686	
매화면	921	320	601	
기성면	1,207	491	716	
온정면	813	130	683	
죽변면	1,343	440	903	
후포면	1,405	537	868	

## □ 관련 유관 기관·단체 현황

단 체 명	회 장	회원수	조직구성	지원내용
울진군새마을회	신용철	443명	지도자협의회 부 녀 회 문 고	· 봉사활동 및 행사 지원 · 교육 여비 지원

## Ⅱ. 2021년 주요업무계획

### 도시계획팀

#### 1 2030년 울진 군관리계획(재정비) 용역

<신규>

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따라 군관리계획 정비를 통해 지역 여건변화 등 장기적인 발전방향을 제시
- 지역현안사업 및 각종 민원 등을 합리적으로 조정하여 종합적인 군관리계획을 수립

#### □ 사업개요

- 대 상 : 도시지역 7개 읍·면, 비도시지역 3개면 (A=989.88km<sup>2</sup>)
- 계획인구 : 45,000명(2030년 울진군 장래인구 추계치 적용)
- 사 업 량 : 군관리계획 재정비, 단계별집행계획, 지형도면고시, 교통성검토, 경관성검토, 재해취약성분석 등 1식
- 사 업 비 : 2,000백만원(군비)

※2021년 500백만원, 2022년 1,500백만원

- 군관리계획 재정비 : 1,500백만원
- 토지적성평가 : 330백만원(별도 발주)
- 사전재해영향평가 : 70백만원(별도 발주)
- 전략환경영향평가 : 100백만원(별도 발주)
- 용역기간 : 2021. 05. ~ 2023. 04.(24개월)

#### □ 추진계획

- 2021. 01. ~ 02. : 원가심사 등 사전행정절차 이행
- 2021. 03. : 사업수행능력평가 실시
- 2021. 05. : 울진 군관리계획(재정비) 용역 착수
- 2021. 06. ~ : 주민공람, 관련부서 협의 등 행정절차 이행
- 2023. 04. : 울진 군관리계획(재정비) 용역 준공

#### □ 기대효과

- 지역 여건변화에 따른 발빠른 대응으로 용도지역의 체계적인 관리로 공공복리 증진
- 2020.7.1. 군계획시설 실효로 군계획시설의 재검토, 단계별 집행 계획, 자원조달계획 수립을 통한 군관리계획의 효율적인 운용

## 2 연호근린공원 조성

<계속>

- 죽변 등대일원, 해안순환레일, 국립해양과학관, 경북해양바이오산업연구원, 드라마세트장, 신울진 1, 2호기, 한수원 사택 등 해안 도로 경관 확보 및

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 연지리 820-6번지 일원
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 4.
- 사업내용 : 연꽃복원, 정자설치, 산책로정비 등
- 총사업비 : 4,268백만원(도 1,986, 군 2,282)

(단위:천원)

구 분	연차별 총사업비	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	'19까지	'20.예산	소계	2021년 (명시이월)	2022년 이 후
계	4,268,000	4,268,000	2,872,000	1,396,000	(868,253)	(868,253)	

### □ 추진실적 및 계획

- 2009. 08. : 군관리계획(연호공원) 결정
- 2011. 04. : 군관리계획(연호공원) 조성계획 결정(변경)
- 2017. 06. : 연호근린공원조성사업 실시설계 용역 시행
- 2018. 02. : 설문조사(정자, 보도교, 데크설치 등) 실시
- 2019. 01. : 공사원가심사
- 2019. 03. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2019. 08. : 연호지 일원 생태환경보전관리계획 수립 용역 착수
- 2019. 10. : 연호근린공원 조성사업 주민설명회
- 2019. 12. : 연호근린공원 조성사업 사업시행
- 2021. 02. : 경관 조명 사업 시행
- 2021. 03. : 토목사업 및 조경사업 준공
- 2021. 04. : 경관 조명 사업 준공(총괄사업완료)


### □ 문제점 및 대책

- 정자 규모에 대한 보완의견이 있어 전망데크 추가 설치(B=2.5m,L=30.0m)예정

### □ 위 치 도



### □ 계획평면도

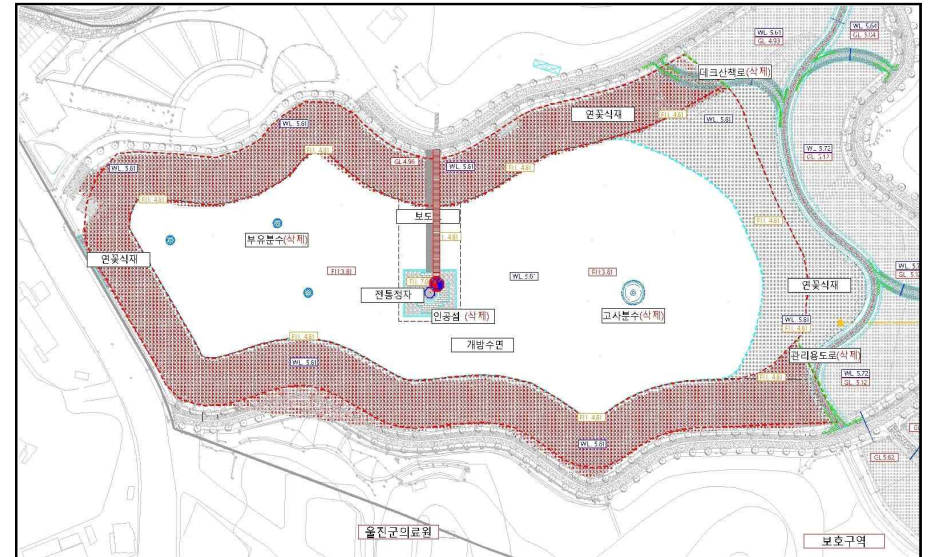



### 3 죽변 ~ 후정간 해안 경관도로 개설사업

<계속>

- 죽변 등대일원, 해안순환레일, 국립해양과학관, 경북해양바이오산업연구원, 드라마세트장, 신울진 1, 2호기, 한수원 사택 등 해안 도로 경관확보 및 관광자원과 연계 필요성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 죽변리 ~ 후정리 일원(시민닭갈비~ 국립해양과학관)
- 사 업 량 : L=1.7km(B=12m)
- 사 업 비 : 7,200백만원(국비7,000, 군비200)

(단위:천원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 19까지	' 20.예산	소계	2021년 (당시이월)	2022년이 후
계	7,200,000	400,000		400,000	6,800,000	180,000 (141,000)	6,620,000

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.


#### □ 추진실적 및 계획

- 2020. 01. ~ : 실시설계용역 착수
- 2020. 05. ~ : 소규모환경영향평가 및 재해영향평가 협의 중
- 2021. 01. ~ : 편입 토지보상 협의(군부대 훈련장 포함 등)
- 2022. 01. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

#### □ 위 치 도



#### □ 도시계획도

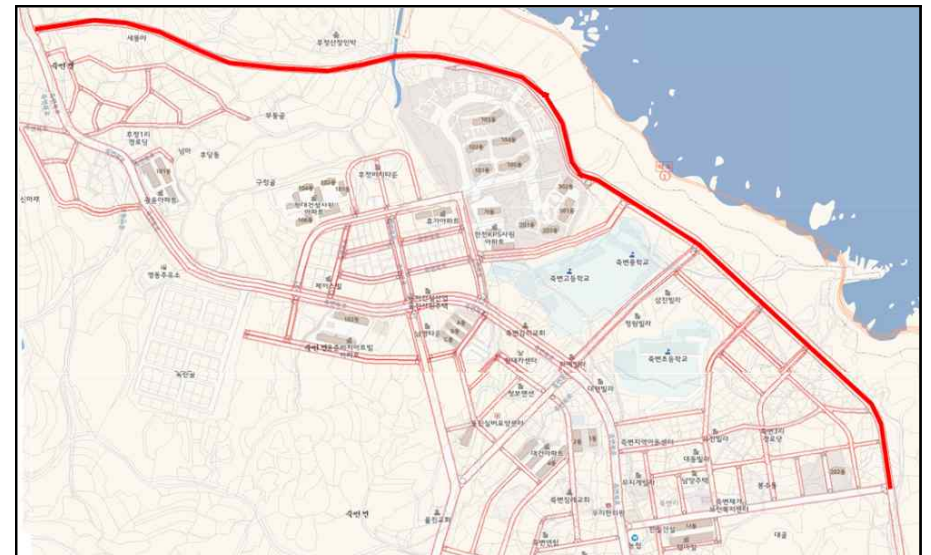

#### 4 월변지구 도시개발 추진

<계속>

- 월변지구 내 미개발된 국유지(철도청)의 종합적인 도시개발사업 추진으로 새로운 시가지를 형성하고 양질의 택지공급

##### □ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내3리 일원(국유지, 舊 철도부지)
- 사 업 량 : 도시개발사업 A=61,994㎡
- 사 업 비 : 약 27,746백만원(추정)

(단위:천원)

구 분	연차별	총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
			소계	' 19까지	' 20.예산	소계	2021년 (명시이월)	2022년 이 후
용 도 별	계	27,746,000	2,364,133	400,000	1,964,133	25,381,867		25,381,867
	설 계 비	417,000	417,000	400,000	17,000			
	토지보상비	20,767,000	1,947,133		1,947,133	21,221,867	(1,879,973)	21,221,867
	공 사 비	4,160,000				4,160,000		4,160,000
	기타조사비	2,402,000				2,402,000		2,402,000

- 사업기간 : 2015. 07. ~ 2022. 12.

##### □ 추진실적 및 계획

- 2017. 09. : 도시개발특별회계 설치조례 제정(울진군 조례)
- 2018. 06. : 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 승인(도 도시계획위원회)
- 2019. 01. : 소규모환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)
- 2019. 01. : 실시계획인가 협의 및 사업시행자 지정 승인
- 2019. 05. : 도시개발사업 개발계획 변경 고시
- 2019. 12. : 감정평가선정 및 감정평가
- 2020. 05. : 실시계획인가 고시, 구역지역(변경), 개발계획(변경)


- 2020. 05. : 부지 매입을 위한 손실보상금 지급 및 사용허가 취득
- 2021. 03. : 철도청부지 용도폐지 완료 및 편입토지 보상 업무 협의  
- 총102필지(철도청 70필지, 사유지 4필지, 울진군 등 28필지)
- 2022. 01. : 조성 부지 착공
- 2022. 12. : 공사 준공(부지조성 완료)

##### □ 문제점 및 대책

- 편입토지 보상가액(208억원)이 상당하여 연차적으로 예산확보  
- 토지 보상을 적당한 구간으로 나누어 분할 매입



## □ 위 치 도

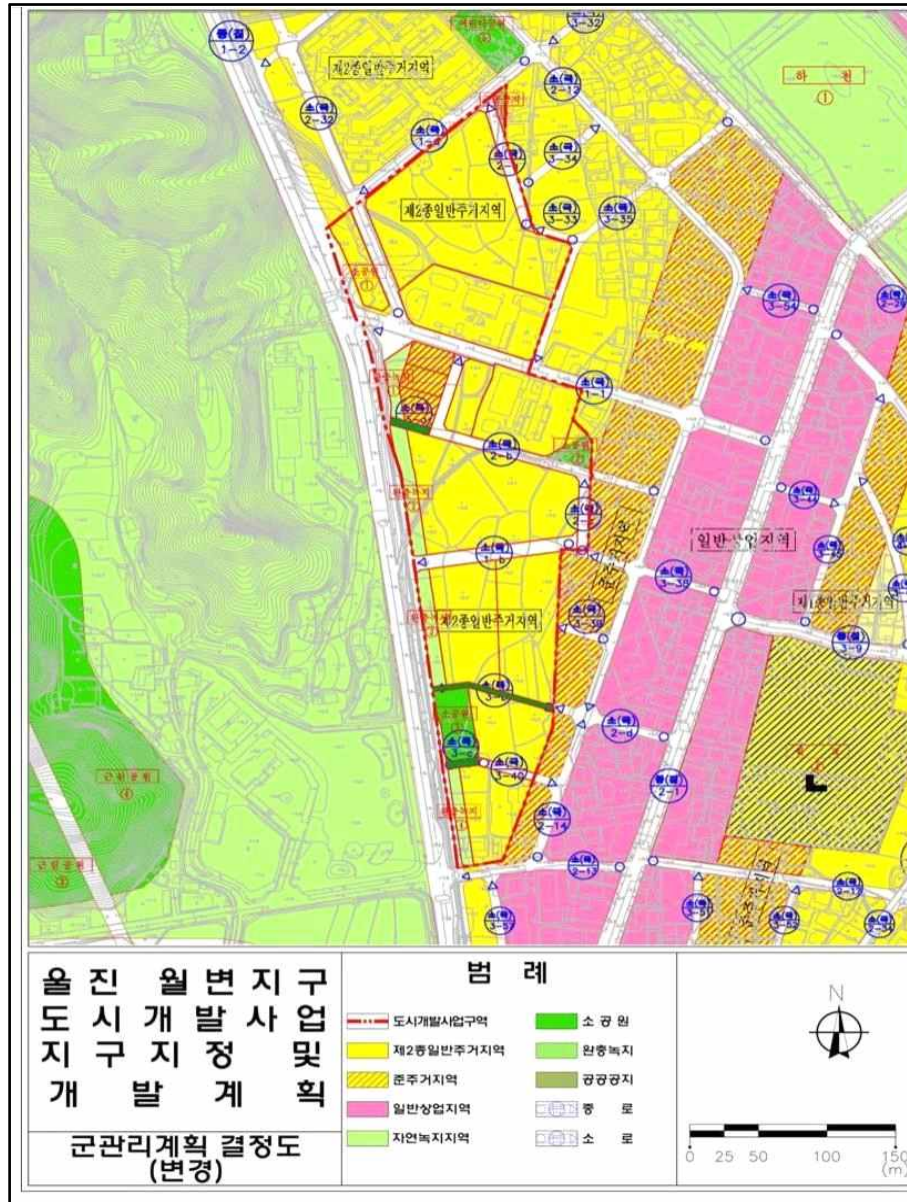

## 8 북면도시계획도로(8개대안사업)

<계속>

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 부구리 일원
- 사업대상 : 도시계획도로개설(17지구), L=2.7km(B=6~15m)
  - 준공 13개 지구 L= 1.9km, 2021년도 추진 4개 지구 L= 0.8km
- 사 업 비 : 12,000백만원

(단위:천원)

구 분	연차별 총사업비	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 19까지	' 20.예산	소계	2021년 예산안	2022년 이 후
계	12,000,000	10,438,653	10,438,653		1,561,347	1,561,347	

- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2022. 12.

### □ 추진실적 및 계획

- 2016. 01. ~ 2018. 06. : 편입토지 및 지장물 보상협의
- 2016. 12. ~ 06. : 13개 지구 준공
- 2021. 03. ~ 12. : 북면도시계획도로(소로2-25호선) 착공 및 준공  
(휴대폰365아울렛⇒대성수산)
- 2021. 03. ~ 12. : 북면도시계획도로(소로3-30호선)착공 및 준공  
(북면노인복지회관 뒤)
- 2022. 01. ~ 12. : 북면도시계획도로(소로3-6호선등 2지구) 착공 및 준공
- 2022. 01. ~ 12. : 북면도시계획도로(소로2-3호선) 착공 및 준공

### □ 문제점 및 대책

- 도시계획도로 계획노선에 저촉되는 주택이 많아 협의 애로
  - 우회노선 검토 등 협의 추진



□ 사업조서

(단위:백만원)

연번	공사명	구간	사업량	사업비	비고
합계	17건		L=2.7km (B=6~15m)	12,000	
1	북면도시계획도로 (소로2-1호선)개설	해광타운 ⇒목화미용실	【L=950m】 L=283m(B=15m)	4,600	준공
2	북면도시계획도로 (소로2-2호선)개설		L=510m(B=15m)		
3	북면도시계획도로 (소로2-23호선)개설		L=157m(B=8m)		
4	북면도시계획도로 (소로2-25호선)개설	휴대폰365아울렛⇒ 대성수산	L=78m(B=8m)	1,500	2021 시행
5	북면도시계획도로 (소로3-30호선)개설	북면119지역대⇒ 대도카센타 앞	【L=262m】 L=128m(B=6m)	500	2021 시행
6	북면도시계획도로 (소로3-31호선)개설		L=45m(B=6m)	600	준공
7	북면도시계획도로 (소로3-35호선)개설		L=89m(B=6m)		
8	북면도시계획도로 (중로2-3호선)개설	부구초등학교 입구⇒중로2-2호선 접속	【L=289m】 L=44m(B=15m)	2,000	준공
9	북면도시계획도로 (소로1-2호선)개설		L=105m(B=10m)		
10	북면도시계획도로 (소로2-12호선)개설		L=130m(B=8m)		
11	북면도시계획도로 (소로2-38호선)개설	부구중앙교회 앞⇒드라마빌라	L=115m(B=8m)	900	준공
12	북면도시계획도로 (소로2-11호선)개설		【L=394m】 L=43m(B=8m)		
13	북면도시계획도로 (소로2-7호선)개설		L=154m(B=8m)		
14	북면도시계획도로 (소로3-23호선)개설	부구중학교 뒤	L=197m(B=6m)	600	토지 보상 협의중
15	북면도시계획도로 (소로3-6호선)개설		【L=504m】 L=270m(B=6m)		
16	북면도시계획도로 (소로2-4호선)개설	2-2호선~부구주택	L=234m(B=8m)	1,300	토지 보상 협의중
17	북면도시계획도로 (소로2-3호선)개설		【L=220m】 L=220m(B=8m)		

□ 2021년 사업계획


○ 위 치 도(소로2-25호선)



○ 도시계획도(소로2-25호선)




○ 위 치 도(소로3-30호선)

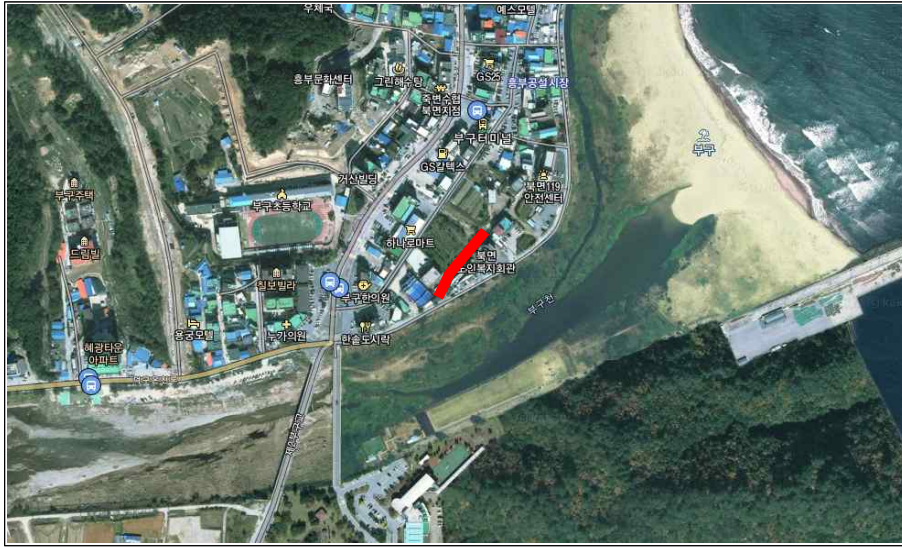

○ 위 치 도(소로3-6호선 등 2지구)



○ 도시계획도(소로3-30호선)

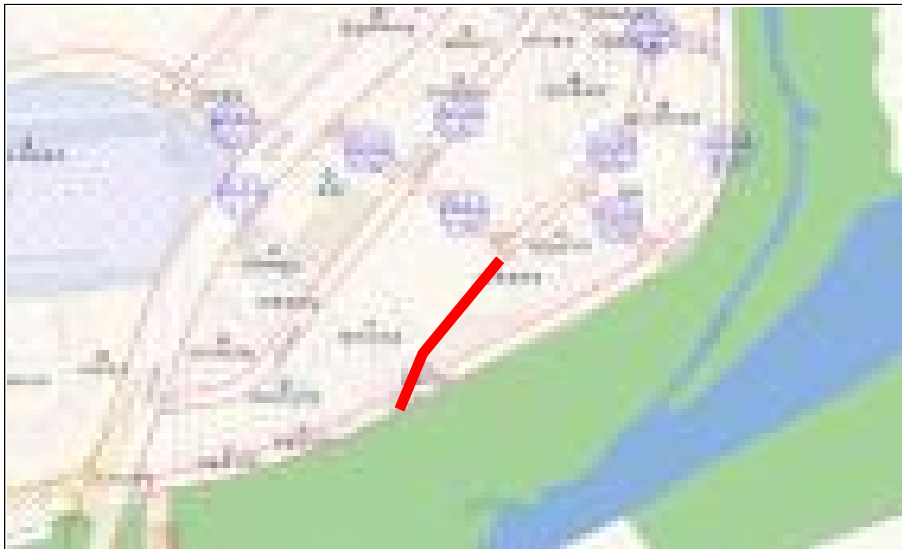

○ 도시계획도(소로3-6호선 등 2지구)



☐ 2021년 보상협의 추진 건



## ○ 위 치 도(소로2-3호선)



## ○ 도시계획도(소로2-3호선)



## 12 후포도시계획도로(소로2-20호선) 배수로 정비

<신규>

- 집중 호우 시 배수 불량으로 교통사고 우려 도로변 배수로를 정비하여 차량과 보행자의 통행 편의를 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 후포면 후포리 한마음광장 뒤 주차장 일원
- 사 업 량 : 배수로개체 L=150m(0.6×0.6m)
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업기간 : 2021. 03 ~ 08.

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 시행
- 2021. 03. : 공사 착공
- 2021. 08. : 공사 준공

### □ 기대효과

- 원활한 배수를 통하여 악취를 제거하여 관광지 이미지 개선 효과 도모하고, 집중 호우 시 도로 및 주변주택의 침수 예방

## □ 위 치 도



## □ 도시계획도



## 13 후포도시계획도로(중로1-1호선) 회전교차로 설치

<신규>

- 도시계획도로와 버스터미널이 위치하여 원활한 교통 흐름 조성
- 시가지 교통체증 해소 및 도시경관 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 후포면 삼율리 버스터미널 일원
- 사 업 량 : 회전교차로(R=40m)
- 사 업 비 : 50백만원(실시설계용역 사업비)
- 사업기간 : 2021. 03 ~ 2021. 12.

## □ 추진계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 시행
  - ※ 용역 결과에 따라 공사사업비 추경 예산 확보
- 2021. 03. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공

## □ 기대효과

- 다수의 도시계획도로와 교통시설 집중지역에 회전교차로를 설치하여 원활한 교통흐름 조성



## □ 위 치 도



## □ 도시계획도



## 14 죽변도시계획도로(소로3-16호선) 덧씌우기공사

<신규>

- 노후 된 도시계획도로 노면 덧씌우기 공사로 주민에게 교통편의 제공
- 도시경관 개선 및 깨끗한 도로 환경 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 죽변리 일원(대건APT 일원)
- 사 업 량 : 포장 덧씌우기 L=300m(B=8m)
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업기간 : 2021. 03 ~ 2021. 06.

## □ 추진계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 시행
- 2021. 03. : 공사 착공
- 2021. 06. : 공사 준공


## □ 기대효과

- 노후 도로를 정비하여 차량과 보행자의 통행편의를 제공

## □ 위 치 도



## □ 도시계획도

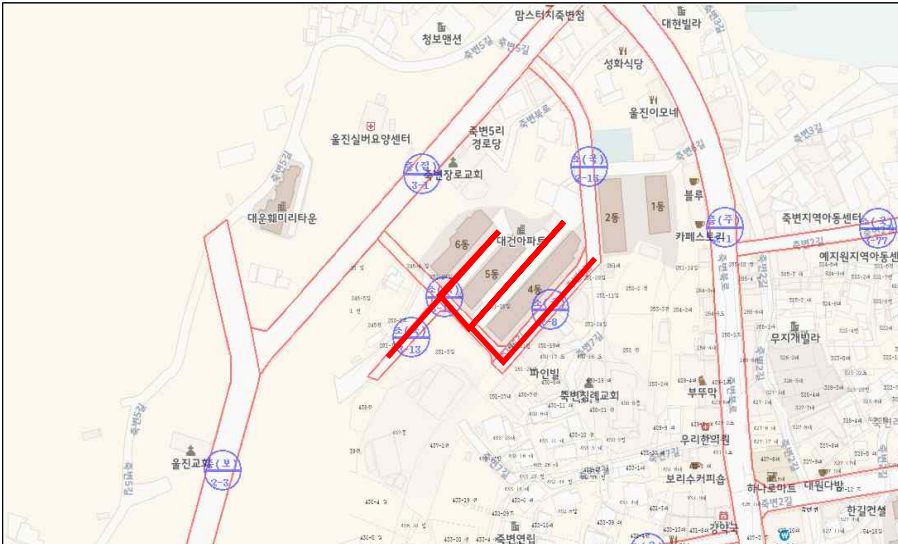

## 15 평해도시계획도로(중로1-1호선) 덧씌우기공사

〈신규〉

- 노후 된 도시계획도로 노면 덧씌우기 공사로 주민에게 교통편의 제공
- 도시경관 개선 및 깨끗한 도로 환경 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 평해읍 평해리 일원(월송초등학교~마이스터고등학교)
- 사 업 량 : 포장 덧씌우기 L=1.2km(B=10m)
- 사 업 비 : 250백만원
- 사업기간 : 2021. 03 ~ 2021. 06.

## □ 추진계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 시행
- 2021. 03. : 공사 착공
- 2021. 06. : 공사 준공

## □ 기대효과

- 노후 도로를 정비하여 차량과 보행자의 통행편의를 제공



[illegible]

- ☐
- 추진계획

- 2021. 2. : 지역역량강화 용역, 어울림플랫폼 건립공사 실시설계 공모 추진, 안전길 조성 공사 시행, 죽변2리 마을회관 리모델링 공사 준공
- 2021. 3. ~ 12. : 회전교차로 개설공사, 포켓공원 조성공사 및 집수리 지원 사업 준공, 상징거리조성, 죽변항길 마당길조성 등 실시설계 용역 및 공사 추진

## □ 세부사업

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 5개, 발주중 : 1개, 발주예정 : 1개)
- (단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	추진일정	비고
계(7개)	14,533			
가옥가꾸	953	<ul style="list-style-type: none"> <li>집수리 50호, 집수리 교육</li> <li>죽변2리 마을회관 리모델링(A=157㎡)</li> </ul>	2020.3.27. ~ 2023.12.	추진중
안전길 조성	950	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전길 조성(담장정비, CCTV 설치, 보행로 포장, 안내사인 등) 1식</li> <li>포켓공원, 공유공간 조성(2개소)</li> </ul>	2020.7.14. ~ 2021.12.	추진중
어울림플랫폼 구축·운영	6,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>플랫폼 신축(1개소) 및 복지회관 리모델링(A=193㎡)</li> <li>플랫폼 운영, 상품개발 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>구축: 2020.10. ~ 2022.12.</li> <li>운영: 2021.~22</li> </ul>	발주중
상권특성화	2,450	<ul style="list-style-type: none"> <li>중앙로상징거리조성(회전교차로, 거리조성, 홍보센터 조성 등) 1식</li> <li>전통시장 가로정비 1식</li> <li>시장 컨설팅, 교육 등</li> </ul>	2020.3.24. ~ 2022.12.	추진중
죽변항길 문화마당조성	2,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>마당길 조성(A=㎡)</li> <li>전망대 가로 시설물 1개소 등</li> </ul>	2020.12. ~ 2022.12.	발주예정
주민역량 강화사업	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육, 신규사업 발굴 등 (도시재생대학, 마을활동가 교육 등)</li> </ul>	2020.10. ~ 2023.12.	추진중
통합마스터 플랜 수립	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>통합마스터플랜 수립 1식</li> </ul>	2020.5.14. ~ 2021.1.8.	추진중

## □ 사업계획도





## 17 2021년 도시재생예비사업(후포면) 추진

- 도시재생뉴딜사업 추진을 위한 소규모 예비사업 시행으로 주민역량강화
- 주민이 직접 발굴한 사업을 지자체에 제안하여 지자체가 공모 신청하고 국토부가 선정

### □ 사업개요

- 추진기간 : 2021년 (1년간)
- 대 상 : 후포면 후포리 316-26번지 일원
- 사업면적 : 123,354㎡
- 사 업 비 : 210백만원[국비 105, 군비 105]
- 주요내용 : 주민공유공간 조성(후포7리마을회관 증축) 및 주민교육(역량강화) 등
- 세부사업

사업명	세부사업명	사업비(천원)		사업내용
합 계		210,000		
모꼬지다락 조성	모꼬지다락 조성	H/W	119,000	○ 후포7리 마을회관 부지를 활용한 주민공유공간 조성 (후포리 623-80번지) • 마을회관 증축: 50㎡
	모꼬지 프로그램 운영	S/W	26,600	○ 주민역량강화(역사문화, 마을여행, 마을경관) ○ 상인역량강화(가드닝, 홍보 마케팅, 서비스 마인드 개선)
창작모꼬지 운영	오프라인 창작모꼬지 지원	S/W	29,700	○ 오프라인 콘텐츠 운영 • 스토리텔링 기법 및 콘텐츠 제작 등 채득
	온라인 창작모꼬지 지원	S/W	2,700	○ 온라인 콘텐츠 제작자 운영 과정 • 온라인 소통 콘텐츠 기획 및 제작
모꼬지장 개최	특산물 전시피 콘테스트 개최	S/W	18,800	○ 주민, 상인, 관광객이 함께하는 지역행사 개최
	특산물 포장박스 시범 제작	S/W	13,200	○ 후포 상인 대상 특산물 포장박스 시범 제작

### □ 추진계획

- 2021. 1 : 2021년 국비 신청 및 교부
- 2021. 2. ~ 8. : 증축 공사 및 역량강화 추진

### □ 기대효과

- 주민들이 도시재생예비사업에 따른 주민역량강화로 후포면 도시재생뉴딜사업 공모 대비 및 사업 추진 준비
- 지역공동체 활성화의 계기 마련

### □ 사업계획도



## 18 나곡4리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 <계속>

### □ 사업개요

- 위 치 : 북면 나곡4리 태봉마을 일원
- 대 상 : 나곡4리(태봉마을)
- 추진기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 총사업비 : 2,394백만원[국비(균특) 1,662, 지방비 554, 자부담 178]
  - 2020년 예산 : 443백만원[국비(균특) 332, 도비 33, 군비 78]
  - 2021년 예산 : 532백만원[국비(균특) 399, 도비 39, 군비 94]
- 사업량 : 약71,380㎡
- 주요내용
  - 취약주택정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리
  - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, CCTV설치, 방화시설, 농기계보관창고 조성
  - 위생시설 정비 : 하수도 신설, 재래식 화장실 정비
  - 주민교육 및 휴먼케어 : 재난안전교육, 소독 및 방역, 선진지 견학

### □ 추진실적

- 2019. 11. : 예비계획수립 용역 시행
- 2019. 12. : 주민설명회 개최
- 2020. 1. : 사업계획서 최종 제출(경북도→균형위, 관계부처)
- 2020. 2. : 대면평가 실시
- 2020. 3. : 사업대상지 선정 및 사업비 교부
- 2020. 4. ~ 12. : 기본계획수립 용역 시행
- 2020. 12. ~ 2021. 1. : 농림축산식품부 대면협의 중

### □ 향후계획

- 2021. 3. : 기본계획 고시 및 실시계획용역 발주
- 2021. 4. : 사업 시행

## 19 온정지구 맑은물 푸른농촌 가꾸기사업

- 농촌의 유·무형 자원을 활용하여 일터, 삶터, 쉼터로서 특색있는 공간을 조성하여 농촌의 자연생태 및 문화를 복원하고 지속가능한 활력 창출 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 온정면 소태1,2 온정1,2 조금1,2
- 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년간)
- 사업내용 : 10개 사업(하드웨어사업 5, 소프트웨어사업 5)
  - H/W사업 : 온정천 생태자연학습장, 성곡천 물놀이장, 백암온천 활성화센터, 백암황토 산책로 등
  - S/W사업 : 마을리더, 주민교육, 백암축제지원, 먹거리프로그램 활성화지원, 관광로드맵 컨설팅 등
- 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,925, 군비 825, 자부담 50)

### □ 추진실적

- 2018. 07. 03. : 기본 및 실시계획용역 착수
- 2018. 08. ~ 2019. 05. : 주민설명회 개최 및 협의(6회)
- 2019. 05. 10. : 지역역량강화용역 착수
- 2019. 06. ~ 09. : 기본 및 실시계획 1,2차 협의(경상북도)
- 2019. 11. 27. : 기본 및 실시계획 3차 협의(경상북도)
- 2020. 02. 06. : 추진위원회 최종 협의
- 2020. 04. 08. : 기본 및 실시계획 최종 협의(경상북도)
- 2020. 06. 01. : 기본계획 고시
- 2020. 09. 24. : 시행계획 고시
- 2020. 10. 25. : 산야초체험관 및 블루베리체험장 리모델링 발주



- 2020. 11. 25. : 마을편의시설, 온정천 생태자연학습장, 성곡천 친환경 하천물놀이장 조성사업 발주
- 2020. 12. 15. : 백암온천활성화센터 개선사업 발주

## □ 향후계획

- 2021. 01. : 산야초 자연학습장길 및 백암산책로 정비사업 시행
- 2021. 12. : 전체 사업 준공

## □ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진중 : 6개, 발주중 3개)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	추진일정	비고
<b>계</b>	<b>2,800</b>	<b>9건</b>		
온정천 생태자연 학습장 조성	110	해먹설치, 수생식물 식재, 조경 정비 등	2020.12.17.~ 2021.03.16.	30%
성곡천 친환경 하천물놀이장 정비	340	물놀이조합놀이대 및 시설물 정비 등	2020.12.18.~ 2021.03.17.	30%
백암산 황토 산책로 정비	270	방부목, 로프웬스 설치 등 등산로 조성	-	발주 중
산야초 자연 학습장길 조성	190	학습장길 조성 및 휴게공간 조성	-	발주 중
블루베리체험관 리모델링 및 증축	120	다락지붕설치(판넬) 및 리모델링	2020.11.10.~ 2021.05.08.	70%
산야초체험장 리모델링	70	비가림시설(캐노피) 설치 및 내부 정비 등	2020.11.10.~ 2021.05.08.	40%
백암온천 활성화센터 개선사업	780	센터, 황토방 정비 카라반 조성 등	-	발주 중
마을편의시설 조성	82	팔각정자, 화장실 등 편의공간 조성	2020.12.17.~ 2021.02.14.	20%
지역역량강화	838	홍보마케팅, 교육, 기본 및 실시설계 등	2018.07.13.~ 2021.05.14.	60%

## □ 위치도



## 20 환한 골목 프로젝트(읍면 보안등 확대설치) 추진 <공약>

- 가로등(보안등) 설치수량의 증가에도 불구하고 산간의 독립형 주택 신축이 늘어나 가로등(보안등) 소외가구 발생
- 이에 효율적이고 즉각적 대응이 가능한 시스템 구축으로 소통·현장행정을 구현하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사업량 : 가로등(보안등) 설치 180여개소
- 사업비 : 250백만원(군비)
- 사업내용 : 군·읍면 사업 분담추진
  - 군 : 설계서 작성, 주요자재구매·공급, 유지관리
  - 읍면 : 설치대상지 선정 및 사업발주

### □ 추진계획

- 2021. 2. : 설치 주요자재 구매 및 표준설계서 작성
- 2021. 3. : 읍면 예산 재배정
- 2021. 3. ~ 4. : 읍면 자체 설치대상지 조사 및 사업발주
- 2021. 6. : 사업완료

### □ 기대효과

- 야간조명 소외 지역 주민 야간 삶의 질 향상
- 야간 범죄 및 사고 예방

## 21 가로등·보안등 광원 변경 지속 추진

<계속>

- 가로등·보안등의 광원을 친환경, 고효율 LED등으로 교체하여 에너지를 절감하고 스마트한 조명환경 조성

### □ 사업개요

- 대상지역 : 울진군 일원
- 사업량 : 500등(사업 후 교체율 76%)
- 사업비 : 300백만원(군비)
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 10.
- 사업내용 : 광원 교체(LED교체)
- 연도별 실적 및 계획

구 분		계	※ 추진실적 ( '17~' 20)	5단계(' 21)	6단계(' 22)	7단계(' 23이후)
교체율(%)			72	76	80	100
조명등	계	12,191	8,786	500	500	2,405
	가로등	4,276	3,448	200	200	428
	보안등	7,915	5,338	300	300	1,977
투자예산(백만원)		5,890	3,500	300	300	1,675

※ LED 설치 현황 : 12,191등 중 8,786등(72%) - 2020. 8.현재

### □ 기대효과

- 유지보수 비용 절약 : 520백만원(연간, 전체 교체시)
  - 전기요금의 30%이상 절감, 가로등 유지보수비 70% 절감
- 친환경 정책에 부응 : 기존 등 대비 친환경, 장수명(5배)



## 22 가로등 신속 유지보수체계 운영 및 설치사업

〈계속〉

- 노후된 가로등이 잦은 고장을 일으켜 가로등 품질 불신에 따른 군정 만족도 저하
- 가로등 신속 정비체계 구축으로 주민불편 해소 및 사고예방에 적극 대처하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사 업 량 : 12,191등 (보안등 7,915, 가로등 4,276)
- 사 업 비 : 1,250백만원(군비)

(단위:백만원)

구 분	계	유 지 관 리		설치사업
		전기요금 등	재료비 / 유지보수	
사 업 비	1,250	600	450	200
사 업 량		10개 읍면	재료비, 유지보수비 및 노후 가로등 교체	주요도로(구7, 36국도) 도로조명 개선 100개

### □ 추진계획

- 2021. 1. ~ 12. : 2개권역(3개반) 유지보수 단가계약 체결 운영
- 2021. 1. ~ 6. : 주요도로 도로조명 개선사업 추진

### □ 기대효과

- 가로등 미설치 주요도로 야간 도로조명 확보로 사고예방
- 정기적인 시설물 점검 및 교체로 감전·누전방지등 안정성 확보
- 야간 수시점검 및 무선감시시스템을 통한 고장개소 파악 운영

## 23 Big3 축제 통합 표준 디자인·캐릭터 개발

〈신규〉

- 축제 통합 표준 디자인 개발로 디자인 가이드라인을 정립하여 축제활성화 및 홍보효과 극대화
- 전국민에게 친숙한 캐릭터 개발을 통해 상품화까지 연계하여 관광콘텐츠의 다양화 도모

### □ 사업개요

- 대 상 : 지역대표축제 3개(울진대게와 붉은대게축제, 울진금강송송이축제, 죽변항 수산물 축제)
- 사 업 량
  - 디자인 개발 3식(축제 표준 디자인(안) 개발)
  - 대게 및 금강송&송이 캐릭터 개발(이모티콘, 캐릭터 상품 개발)
- 사 업 비 : 100백만원(군비)

### □ 추진계획

- 2021. 1. : 사업 공모
- 2021. 2. : 사업 착수
- 2021. 6. : 사업 완료

응용시스템  
디 자 인

- 홍보물 디자인 : 현수막, 가로등배너, 전시부스, 포스터, 선전탑 등 대표이미지를 활용한 매체 디자인
- 판촉물 및 상품 개발 : 축제를 상징하는 상품 개발

캐릭터

- 축제를 대표하는 캐릭터를 개발해 관광마케팅 활동 강화

### □ 기대효과

- 지역 특색을 살린 축제의 독창성 있는 디자인 개발로 울진군 홍보효과 극대화
- 퀄리티 있는 디자인 및 캐릭터 개발로 대외적 호감도 및 지역 이미지 상승효과

## □ 사업예시

○ 논산 대표5대 축제 통합브랜드 디자인 및 캐릭터 개발 예시 사례



## 24 포토조형물 설치(관광지에 작품하나)

<신규>

○ 울진바다를 배경으로 사진찍기 좋은 곳에 작은 소품하나 더하듯 포토조형물을 설치하여 사진을 통한 활발한 SNS소통 홍보효과

## □ 사업개요

- 위 치 : 근남 망양정, 해맞이공원 주변
- 사 업 비 : 100백만원(군비)
- 사 업 량 : 포토 조형물 3개소 정도



## □ 추진계획

- 2021. 2. : 관계기관 협의(문화관광과, 해양수산과)
- 2021. 4. : 디자인 · 업체선정(통합)
- 2021. 6. : 제작설치

## □ 기대효과

- SNS소통으로 홍보효과→관광객 증가
- 포토 조형물을 모티브로 한 다양한 포토존 조성 봄
- 지역을 기억하는 이미지, 재방문 동기유발



## 25 벚꽃 길 경관조명 설치

<신규>

- 울진군의 젓줄 “왕피천”을 따라 망양정에 이르는 망양정로에는 벚꽃나무와 보행로(데크)가 400m 조성되어 있어 벚꽃을 매개로한 관광아이템 개발이 필요
- 벚꽃개화기에 야간 벚꽃 매력을 보여줄수 있는 조명시설 설치로 케이블카 운행과 함께 야간경관 명소로 조성

### □ 사업개요

- 위 치 : 근남면 노음리(망양정로)
- 사 업 비 : 120백만원(군비)
- 사 업 량 : 바닥조명 40등, 분전함 1식 (L=400m)
- 사업내용 : 바닥 야간조명 설치로 벚꽃 길 활성화

### □ 추진계획

- 2021. 2. : 사업 설계
- 2021. 3. : 사업 착수 및 준공(※벚꽃 개화기 이전 완료)

### □ 기대효과

- 왕피천케이블카 운행과 더불어 야간경관을 조성하여 대표적인 지역명소로 탈바꿈
- 2000년도 초반 “지역 대규모 가로수 식재사업” 결실을 맺을 수 있는 다양한 사업 확장(예-걷기행사, 둘레길 조성, 민간투자)

### □ 사업예시



### □ 위치도 및 전경사진



세미그룹

## 26 일반농산어촌개발사업 추진(종합진도 49.5%)

- 낙후지역의 체계적 개발로 농어촌 지역 간 균형발전 추진
- 지역주민 소득증대 및 생활복지 향상

□ 추진대상 : 7개지구(40개소), 총사업비 282억원(국비 178, 군비 104)

○ 2021년까지 : 206억원(집행액 : 102억원)

□ 사업완료 : 2개지구(7개소), 31억원(집행액 : 31억원)

□ 추진중사업 : 7개지구(33개소), 251억원(집행액 : 71억원)

□ 사업현황

(단위:백만원)

지 구 명	위 치		사 업 량 (지구)	총 사 업 비		2021년이후	비고
	읍면	리동		2021년까지	집행액		
계			7 (40)	20,694	10,242	7,539	
농촌중심지 활성화사업	북면 금강송면 기성면	소재지 일원	3 (21)	13,538	8,036	-	
평해읍 기초생활거점 육성사업	평해읍	소재지 일원	1 (5)	1,604	538	2,396	
신활력플러스사업	울진군	일원	1 (4)	3,552	113	3,643	
어울진 시군창의사업	매화면	갈면리	1 (2)	1,500	1,500	-	
십이령 바지개곶마을 농촌다움복원사업	북면	상당리 하당리	1 (8)	500	55	1,500	

□ 사업완료 : 2개지구(7개소)

(단위:백만원)

지 구 명	세부사업명	사업비	집행액	사업기간	비 고
합 계	2개지구(7개소)	3,104	3,104		
기성면 농촌중심지 활성화사업	소 계(4개소)	1,773	1,773		
	인기척산책로	189	189	2019.7.19.~2019.11.15.	100%
	인기척화합마중길	43	43	2019.11.1.~2019.12.30.	100%
	안전드라이브길	1,057	1,057	2019.8.1.~2020.4.7.	100%
금강송면 농촌중심지 활성화사업	소재지 중심가로 경관개선	484	484	2019.7.29.~2020.8.1.	100%
	소 계(3개소)	1,331	1,331		
	금강송로 안길 정비	265	265	2020.1.13.~2020.6.24.	100%
	광천 산책로 정비	474	474	2020.1.13.~2020.7.10.	100%
	가로경관 개선	592	592	2020.1.10.~2020.10.13.	100%

□ 추진중사업 : 7개지구(33개소)

(단위:백만원)

지 구 명	세부사업명	사업비	집행액	사업기간	비 고
합 계	7개지구(33개소)	25,129	7,138		
기성면 농촌중심지 활성화사업	소 계(4개소)	3,923	1,915		
	행복나눔센터	2,266	974	2020.8.21.~2021.5.2.	20%
	작은사랑채	240	240	2020.7.22.~2021.1.17.	95%
	안전마을 조성	160	-	2020.12.~2021.6.	발주예정
	지역역량강화	1,257	701	2019.1.8.~2020.6.30.	80%
북면 농촌중심지 활성화사업	소 계(4개소)	3,917	2,146		
	홍부시장 조성	2,175	1,266	2020.10.29.~2021.6.25.	20%
	공영주차장 조성	82	-	2021.6.~2021.10.	발주예정
	부구한마음쉼터 조성	741	-	2021.6.~2021.10.	발주예정
	지역역량강화	919	880	2019.12.19.~2021.12.17.	80%



지 구 명	세부사업명	사업비	집행액	사업기간	비 고
금강송면 농촌중심지 활성화사업	소 계(6개소)	2,594	871		
	북지회관 리모델링	280	130	2020.7.16.~2021.1.29.	95%
	마을회관 리모델링	384	173	2020.7.22.~2021.1.29.	95%
	금강송 맞이방	391	188	2020.6.29.~2021.2.28.	80%
	맞이방 야외무대설치	169	117	2020.6.29.~21.1.29.	95%
	무선마을방송시스템	53	-	2020.12.~2021.6.	발주예정
	지역역량강화	1,317	263	2019.12.19.~2021.12.17.	70%
평해읍 기초생활거점 육성사업	소 계(5개소)	4,000	538		
	행복만남커뮤니티센터	2,046	-	2021.10.~2022.10.	발주예정
	행복만남광장	716	-	2021.10.~2022.10.	발주예정
	가로경관개선	351	-	2021.10.~2022.10.	발주예정
	지역역량강화	350	279	2020.8.19.~2022.12.31.	10%
	기본계획 및 실시설계	537	259	2020.8.14.~2021.8.13.	10%
울진군 신활력 플러스사업	소 계(4개소)	7,195	113		
	미식1번지 인프라 구축	1,340	-	2021.6.~2024.12.	발주예정
	미식1번지 플랫폼 구축	3,498	-	2021.6.~2024.12.	발주예정
	미식1번지 미래인재육성	1,790	-	2021.6.~2024.12.	발주예정
	기본계획 및 실시설계	567	113	2020.12.~2024.12.	30%

지 구 명	세부사업명	사업비	집행액	사업기간	비 고
어울진 시군창의사업	소 계(2개소)	1,500	1,500		
	어울진 공원조성	1,155	1,155	2019.6.~2021.12.	10%
	지역역량강화	385	385	2019.4.~2021.12.	10%
십이령 바지개꾼 농촌다움 복원사업	소 계(8개소)	2,000	55		
	전수관 증축	770	-	2021.7.~2022.7.	발주예정
	스토리월 설치	34	-	2022.3.~2022.10.	발주예정
	태양광발전 설치	200	-	2022.3.~2022.12.	발주예정
	바지개꾼 테마거리 조성	21	-	2022.3.~2022.10.	발주예정
	바지개꾼 야간조명 설치	208	-	2021.7.~2021.12.	발주예정
	바지개꾼 쉼터 조성	41	-	2021.3.~2021.12.	발주예정
	지역역량강화	646	-	2021.7.~2022.12.	발주예정
	기본계획 및 실시설계	80	55	2020.4.17.~2021.6.30.	60%

## 26-1 기성면 농촌중심지 활성화사업

- 농산어촌지역의 정주여건을 개선하고 생활편의 기초서비스 제공
- 면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상 도모

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 기성면 기성리 및 척산리 일원
- 사 업 비 : 5,696백만원(국비 3,978, 군비 1,718)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년간)
- 사업내용 : 8개사업(하드웨어사업 7, 소프트웨어사업 1)
  - 작은사랑채(공동생활홈), 행복나눔센터, 인기척화합마중길, 소재지 중심가로 경관개선, 안전드라이브길, 인기척 산책로, 안심마을 조성, 지역역량강화

### □ 추진실적

- 2017. 07. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2019. 12. : 인기척 산책로 및 화합마중길 준공
- 2020. 03. : 안전드라이브길 준공
- 2020. 07. 22. : 작은사랑채(노인회관 신축) 착공
- 2020. 08. 21. : 행복나눔센터(문화센터 신축) 착공
- 2020. 08. : 소재지중심가로 경관개선 준공
- 2020. 12. : 안전마을조성사업(CCTV) 행정예고

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 안전마을조성(CCTV 및 마을방송시스템) 발주, 울진군 마을방송시스템과 연계
- 2021. 04. : 지역역량강화용역 준공
- 2021. 06. : 8개 사업 준공(하드웨어 7개, 소프트웨어 1개사업)

### □ 세부사업별 현황

- 완료사업(4개사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(4건)	1,773	1,773			
인기척산책로	189	189	· 등산로 정비 L=1.5km	준공 (2019.11.15.)	100%
인기척화합마중길	43	43	· 가드레일 설치 L=0.36km	준공 (2019.12.28.)	100%
안전드라이브길	1,057	1,057	· 구 국도 인도 설치 L=1.02km	준공 (2020.3.30.)	100%
소재지중심가로 경관개선	484	484	· 가로경관개선 L=0.36km · 시장개선 L=0.13km	준공 (2020.8.3.)	100%

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 3개사업, 발주예정 : 1개사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(4건)	3,923	1,915			
행복나눔센터	2,266	974	· 복지회관 신축 A=788㎡	2020.8.21.~ 2021.5.2.	20%
작은사랑채 (공동생활홈)	240	240	· 노인회관 신축 A=300㎡	2020.7.22.~ 2021.1.17.	10%
안전마을조성	160	-	· CCTV 및 마을방송시스템 설치	2020.12.~ 2021.6.	발주 예정
지역역량강화 등	1,257	701	· 교육 홍보, 컨설팅 경영지원 등	2019.1.8.~ 2020.6.	80%

## □ 위 치 도



## 26-2 북면 농촌중심지 활성화사업

- 농산어촌지역의 정주여건을 개선하고 생활편의 기초서비스 제공
- 면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상 도모

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 북면 부구리 일원
- 사업비 : 3,917백만원(국비 2,742, 군비 1,175)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년간)
- 사업내용 : 4개사업(하드웨어사업 3개, 소프트웨어사업 1개)
  - H/W사업 : 흥부시장 신축, 공영주차장, 부구 한마음쉼터
  - S/W사업 : 지역역량강화사업

### □ 추진실적

- 2018. 07. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 08. 19. : 추진위원회 실시설계 관련 최종 협의
- 2020. 10. 15. : 주변 건축물(4동) 사전안전진단용역 완료
- 2020. 10. 29. : 공사(건축, 전기, 소방) 착공
- 2020. 11. 30. ~ 12. 31. : 시장장옥 및 복지회관 어린이집 건물 철거 완료

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 토공 작업 및 기초콘크리트 타설
- 2021. 02. ~ 03. : 건축 구조물(벽체 및 슬라브) 시공
- 2021. 04. ~ 06. : 내·외장공사 및 토목 부대공사
- 2021. 06. : 흥부시장 조성공사 준공
- 2021. 06. : 공영주차장 조성 및 부구한마음쉼터 조성사업 착공
- 2021. 10. : 공영주차장 조성 및 부구한마음쉼터 조성사업 준공



## □ 세부사업별 현황

○ 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 2개사업, 발주예정 : 2개사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(4건)	3,917	2,146			
홍부시장 조성사업	2,175	1,266	· 홍부시장 신축 28동	2020.10.29.~ 2021.6.25.	20%
공영주차장 조성	82	-	· 주차장조성 A=2,277㎡	2021.6.~ 2021.10.	발주 예정
부구한마음 쉼터 조성	741	-	· 다목적광장 조성 A=930㎡	2021.6.~ 2021.10.	발주 예정
지역역량 강화 등	919	880	· 교육, 홍보, 컨설팅 등	2019.12.19.~ 2021.12.17.	80%

## □ 위 치 도



## 26-3 금강송면 농촌중심지 활성화사업

- 농산어촌지역의 정주여건을 개선하고 생활편의 기초서비스 제공
- 면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상 도모

## □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 금강송면 삼근리 일원
- 사 업 비 : 3,925백만원(국비 2,748, 군비 1,177)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년간)
- 사업내용 : 9개사업(하드웨어사업 8개, 소프트웨어사업 1개)
  - 복지회관 리모델링, 마을회관 리모델링, 금강송 맞이방 조성, 금강송맞이방 무대설치, 무선마을방송시스템 구축, 광천산책로 정비, 가로경관 개선, 금강송길 안길 정비, 지역역량강화용역

## □ 추진실적

- 2018. 07. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 01. : 지역역량강화용역 착수보고회 개최
- 2020. 06. : 금강송로 마을안길 정비공사 준공
- 2020. 07. : 맞이방, 야외무대, 복지회관 및 마을회관 리모델링공사 착공
- 2020. 08. : 광천 산책로 정비공사 준공
- 2020. 10. : 가로경관 개선공사 준공

## □ 추진계획

- 2021. 01. : 복지회관 리모델링공사 등 3건 준공
- 2021. 02. : 금강송 맞이방 조성공사 준공
- 2021. 12. : 지역역량강화용역 준공

## □ 세부사업별 현황

### ○ 완료사업(3개사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(3건)	1,331	1,331			
금강송로 안길정비	265	265	· 안길정비 1식	준공 (2020.6.24.)	100%
광천산책로정비	474	474	· 산책로 정비 A=2,137㎡	준공 (2020.8.27.)	100%
가로경관개선	592	592	· 보도정비 A=1,662㎡ · 데크포장 A=257㎡	준공 (2020.10.13.)	100%

### ○ 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 5개사업, 발주예정 : 1개사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(6건)	2,594	871			
복지회관 리모델링	280	130	· 복지회관 리모델링 A=231㎡	2020.7.16.~ 2021.1.29.	95%
마을회관 리모델링	384	173	· 리모델링 A=213㎡, · 증축 A=40㎡	2020.7.22.~ 2021.1.29.	95%
금강송 맞이방 조성	391	188	· 맞이방 신축 A=104.5㎡	2020.6.29.~ 2021.2.28.	80%
금강송 맞이방 야외무대설치	169	117	· 야외무대설치 1식	2020.6.29.~ 21.1.29.	95%
무선마을 방송시스템	53	-	· 무선방송시스템 1식	2021.1.~ 2021.6.	발주 예정
지역역량 강화 등	1,317	263	· 교육, 홍보, 컨설팅 등	2019.12.19.~ 2021.12.17.	70%

## □ 위 치 도





## 27 평해읍 기초생활거점 육성사업

- 농촌중심지인 읍소재지에 교육·복지·문화 등 중심기능 확충
- 배후마을로 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계 구축

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 평해리 일원
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사업내용 : 5개사업(하드웨어사업 3개, 소프트웨어사업 2개)
  - 행복만남커뮤니티센터, 행복만남광장, 가로경관개선, 지역역량강화용역, 기본 및 실시설계용역

### □ 추진실적

- 2020. 08. 14. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 08. 19. : 지역역량강화용역 착수
- 2020. 09. 09. : 착수보고회 개최
- 2020. 10. 29. : 추진위원회 개최[부지위치 변경(안) 협의]
- 2020. 11. 05. : 편입토지(사유지) 기공승락서 징구 완료
- 2020. 12. 04. : 편입토지(국유지) 매입 관련 협의 완료(한국철도공단)

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 사업지구 변경에 따른 경북도 및 농림부 협의
- 2021. 03. : 기본계획 고시
- 2021. 06. : 시행계획 고시
- 2021. 10. : 사업 착공
- 2024. 12. : 사업 준공

### □ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 2개사업, 발주예정 : 3개사업)  
(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(5건)	4,000	538			
행복만남 커뮤니티센터	2,046	-	· 행복만남 커뮤니티센터 신축 A=398㎡	2021.10.~ 2022.10.	발주 예정
행복만남광장	716	-	· 산책로 정비 600㎡	2021.10.~ 2022.10.	발주 예정
가로경관개선	351	-	· 가로경관개선 A=1,107㎡	2021.10.~ 2022.10.	발주 예정
지역역량강화사업	350	279	· 교육, 홍보, 컨설팅 등	2020.8.19.~ 2022.12.31.	10%
실시설계 등 부대비	537	259	· 기본계획 및 실시설계 용역 1식	2020.8.14.~ 2021.8.13.	10%

### □ 위 치 도





## 28 울진군 신활력플러스 사업

- 지역 자원(농특산물, 관광) 연계 및 활용을 통한 지역경제 활성화 도모
- 미래 성장기반 확보를 위한 타지역과 차별화된 미식산업 육성

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 10개 읍·면
- 사업비 : 7,195백만원(국비 4,900, 군비 2,100, 자부담 195)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사업내용 : 미식1번지 플랫폼 및 인프라 구축 1식

### □ 추진실적

- 2019. 07. 03. : 신활력플러스사업 예비계획 수립 연구용역 착수
- 2019. 12. 16. : 신활력플러스사업 예비계획 수립 연구용역 준공
- 2020. 06. 01. : 기본 및 시행계획 수립 연구용역 착수
- 2020. 09. 17. : 신활력 플러스 권역별 자문회의 개최
- 2020. 11. 16. : 일반농산어촌개발사업 추진 및 중간지원조직 운영·관리에 관한 조례 제정

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 신활력플러스사업 추진단 구성
- 2021. 02. : 지역역량강화용역 시행
- 2021. 04. : 기본계획 고시
- 2021. 05. : 복합 FOOD센터 조성 실시설계용역 시행
- 2021. 08. : 시행계획 고시
- 2021. 09. : 기본 및 시행계획용역 준공
- 2021. 10. : 하드웨어 및 소프트웨어사업 착수
- 2023. 12. : 사업 준공
- 2024. 12. : 사업 준공

### □ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 1개사업, 발주예정 : 3개사업)  
(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(4건)	7,195	113	4건		
미식1번지 인프라 구축	1,340	-	· 미식1번지 식재료 기반 구축 · 미식1번지 레스토랑 조성 · 미식1번지 복합 FOOD센터 조성 · 미식1번지 프런티어 상품개발 · 미식1번지 프런티어 홍보마케팅	2021.6.~ 2024.12.	발주 예정
미식1번지 플랫폼 구축	3,498	-	· 미식1번지 프런티어센터 조성 · ICT 통합 플랫폼 시스템 구축 · 미식1번지 프런티어 센터 운영	2021.6.~ 2024.12.	발주 예정
미식1번지 미래인재육성	1,790	-	· 미식1번지 창업기반 조성 · 미식1번지 아카데미 운영 · 미식1번지 글로벌 미식학교 운영 · 주민참여형 공모사업	2021.6.~ 2024.12.	발주 예정
실시설계 등 부대비	567	113	· 기본계획 및 실시설계용역 1식	2020.12.~ 2024.12.	30%

### □ 위치도 및 평면도



## 29 어울진 시군창의사업 추진

- 농산어촌이 공존하는 울진군의 특성을 살려 각 읍면단위의 특산물과 관광자원을 연계하여 네트워크 구축 및 교류 기대

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 매화면 갈면리 일원
- 사 업 비 : 1,500백만원(국비 700, 군비 800)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년간)
- 사업내용 : 2개사업(하드웨어사업 1, 소프트웨어사업 1)
  - H/W사업 : 어울진 공원 조성 A=9,407㎡(쉼터, 산책로, 화장실 등)
  - S/W사업 : 지역역량강화사업

### □ 추진실적

- 2017. 04. : 위·수탁 협약 체결(한국농어촌공사)
- 2017. 06. ~ 11. : 기본 및 세부설계용역 착수
- 2019. 02. : 기본계획 고시
- 2019. 04. : 시행계획 고시
- 2019. 07. : 소규모환경영향평가 협의(대구지방환경청)
- 2020. 06. : 재해영향성검토 협의 완료
- 2020. 12. : 용도지역 결정(변경) 협의(경상북도)

### □ 추진계획

- 2021. 03. : 용도지역 결정(변경) 및 농업진흥지역 해제
- 2021. 04. : 군계획시설 결정 및 실시계획인가 고시
- 2021. 06. : 사업 착공
- 2021. 12. : 사업 준공

### □ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 2개 사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(2건)	1,500	1,500	2건		
어울진 공원조성	1,115	1,115	· 공원 조성 A=16,329㎡	2021.6.~ 2021.12.	10%
지역역량강화	385	385	· 홍보마케팅, 컨설팅, 교육 · 기본계획 및 실시설계	2021.6.~ 2021.12.	10%

### □ 위 치 도



### 30 십이령 바지개곶마을 농촌다움복원사업

- 지역의 고유한 역사문화정신을 바탕으로 지역문화 계승
- 마을 공동체 중심 농촌가치의 보전 및 마을 자원 재발견으로 지역 활력 창출

#### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 북면 상당리 및 하당리 일원
- 사 업 비 : 2,000백만원(군비 2,000)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 사업내용 : 8개사업(하드웨어사업 6, 소프트웨어사업 2)
  - H/W사업 : 전수관 신축, 십이령바지개곶 스토리월 설치, 태양광발전 설치, 바지개곶 거리 안내판 설치, 바지개곶 야간조명 설치, 바지개곶 쉼터 조성
  - S/W사업 : 지역역량강화사업, 기본계획 및 실시설계

#### □ 추진실적

- 2020. 04. 03. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 05. 21. : 착수보고회 개최
- 2020. 07. 16. : 추진위원회 협의(1차)
- 2020. 08. 12. : 추진위원회 협의(2차)

#### □ 추진계획

- 2021. 03. : 기본계획 고시
- 2021. 05. : 시행계획 고시
- 2021. 07. : 사업 착공
- 2022. 12. : 사업 준공

#### □ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 : 1개사업, 발주예정 : 7개사업)  
(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	집행액	사 업 내 용	추진일정	비고
계(8건)	2,000	55	8건		
전수관 신축	770	-	· 전수관 증축 A=600㎡	2021.7.~ 2022.7.	발주 예정
십이령바지개곶 스토리월 설치	34	-	· 스토리월 설치 1식	2022.3.~ 2022.10.	발주 예정
태양광발전 설치	200	-	· 태양광발전 설치 80KW	2022.3.~ 2022.12.	발주 예정
바지개곶 테마거리 조성	21	-	· 테마거리 조성 L=3.4km	2022.3.~ 2022.10.	발주 예정
바지개곶 야간조명 설치	208	-	· 야간조명 설치 30본	2021.7.~ 2021.12.	발주 예정
바지개곶 쉼터 조성	41	-	· 쉼터 조성 A=500㎡	2021.7.~ 2021.12.	발주 예정
지역역량강화 등	646	-	· 홍보마케팅, 컨설팅, 교육	2021.7.~ 2022.12.	발주 예정
실시설계 등 부대비	80	55	· 기본계획 및 실시설계용역	2020.4.17.~ 2021.6.30.	60%



## □ 위 치 도



## 31 마을회관 개선사업

<계속>

○ 노후된 마을회관 보수 및 증축으로 내구년한 증대 및 주민 불편사항 해소

### □ 추진개요

- 위 치 : 울진군 10개 읍·면
- 사 업 비 : 730백만원(도비 50, 군비 680)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2021년(1년간)
- 사업내용 : 마을회관 증축 및 보수 1식

### □ 추진실적

(단위 : 백만원)

사 업 명		위 치		사업량	사 업 비			비 고
		읍면	리동		계	도비	군비	
합 계					730	50	680	
보수	소 계	2	지구		100		100	
	후포5리	후포	후포5	보수 1식	50		50	
	기양1리	매화	기양1	보수 1식	50		50	
증축	소 계	2	지구		130	50	80	
	삼율3리	후포	삼율3	증축 1식	30		30	
	사계2리	북면	사계2	증축 1식	100	50	50	
유지관리	소 계		지구		500		500	
	유지관리	10개 읍·면	유지관리	1식	500		500	

### □ 추진계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 착수
- 2021. 02. ~ 12. : 마을회관 유지관리 및 보수
- 2021. 03. : 사업 착공
- 2021. 12. : 사업 착공

### III. 특수시책

#### 도시재생팀

#### 1 후포면 도시재생 뉴딜사업 공모 추진

- 국정운영 계획에 맞추어 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로 도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련
- 죽변면 도시재생사업 선정됨에 따라 후포면 도시재생 활성화 계획을 수립하여 차후 공모 신청 계획

##### □ 사업개요

- 위 치 : 후포면 후포리 316-26번지 일원
- 과업내용 : 후포면 도시재생 활성화계획 수립(SOC생활 거점 구축, 생활환경 개선, 지역공동체 활성화)
- 과업추진기간 : 2021년
- 용역비 : 312백만원
- ※ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업비 : 133억원[국비(균특) 80, 도비 13, 군비 40]

##### □ 추진실적

- 2019. 12. 16. : 후포면 도시재생 활성화계획 수립 용역 착수
- 2020. 08. 26. : 후포면 도시재생사업 주민협의체 구성
- 2020. 08. 31. : 후포면 도시재생 뉴딜사업 주민설명회 및 주민협의체 회의
- 2020. 10. ~ 11. : 도시재생대학 운영

##### □ 추진계획

- 2020. 10. ~ 21. 3. : 신규 사업 발굴
- 2021. 01. ~ 06. : 2021년 도시재생 뉴딜사업 공모 준비(주민공청회, 의회의견 청취, 관계기관 협의 등)
- 2021. 07. : 공모 신청(2021년 도시재생 가이드라인에 따른 공모추진)

##### □ 기대효과

- 쇠퇴한 도시지역의 도시환경정비 및 주민공동체 활성화를 통해 도시의 쇠퇴를 방지하고 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

#### 2 농촌협약 사업 추진에 따른 용역 시행

- 정책방향 변화에 적극 대응하고 지역사업에 대한 주민의 자발적인 참여를 유도하여, 농어촌 지역의 일자리 창출 및 삶의 질 향상을 위함
- 농촌공간전략 및 생활권활성화계획을 수립하여 2022년 농촌협약 사업 공모 신청 계획

##### □ 사업개요

- 위 치 : 2개 지구(울진군 울진읍, 근남면 일원)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업내용 : 중심시가지 활성화-울진읍, 기초생활 거점조성-근남면
- 용역비 : 491백만원(군비)
- 용역과제
  - 농촌공간 전략계획 수립
  - 농촌생활권 활성화계획 수립
  - 울진읍 농촌중심지 활성화 사업 : 150억원[국비(균특) 105, 군비 45]
  - 근남면 기초생활거점조성사업 : 40 ~ 50억원[국비(균특) 28, 군비 12]

##### □ 추진계획

- 2020. 11. : 농촌공간 전략계획 및 생활권 활성화계획 용역 발주
- 2021. 01. : 용역 계약 및 시행
- 2021. 05. : 용역완료 및 공모사업 신청(농림축산식품부 지역개발과)

##### □ 기대효과

- 지역 실정에 맞는 농촌공간 전략계획 및 생활권 활성화계획을 수립
- 농촌지역의 생활 여건 개선과 농업소득 및 일자리 창출로 농어업인의 삶의 질 향상에 기여

### 3 취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진

- 취약지역 생활여건 개조사업 추진을 위한 2021년 공모신청
- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등  
긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량을 강화

#### □ 사업개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)
- 대 상 : 2개 지구(기성면 망양2리, 온정면 덕산1리)
- 사 업 량 : 지구당 생활여건 개조사업 1식
- 사 업 비 : 지구별 2,000백만원[국비(균특) 1,400, 지방비 600]  
※ 용역비 : 44백만원(균비)
- 주요내용
  - 취약지역 주민의 안전·위생 등 생활 인프라 확충
  - 슬레이트지붕 철거 및 빈집 철거 등 주거환경 개선
  - 휴먼케어 및 주민역량강화

#### □ 추진계획

- 2020. 9. ~ 10. : 예비계획 수립 용역 시행
- 2020. 12. : 사업계획서(예비) 제출(군 → 경상북도)
- 2021. 1. 13. : PPT자료 발표(비대면 평가)
- 2021. 1. ~ 2. : 도 자체평가 실시
- 2021. 3. : 사업지구 선정

#### □ 기대효과

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등  
생활 인프라 확충
- 슬레이트지붕 철거 및 빈집철거 등 주거환경 개선 및 주민역량강화
